

郊区2024年度衔接资金重点项目

绩效目标运行监控报告

为全面贯彻落实党中央关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，进一步加强衔接资金(整合资金)绩效管理，发挥资金最大效益，按照《黑龙江省财政厅等六部门关于进一步做好衔接及整合项目资金绩效管理有关工作的通知》(黑财农[2022]194号)要求，区乡村振兴局会同区财政局，选取2024年实施的长青乡四合村现代农业产业园项目项目作为2024年度重点项目开展绩效运行监控，现将具体情况报告如下：

一、监控方式

区财政局会同区乡村振兴局对2024年长青乡四合村现代农业产业园项目，采取旬调度项目进展、实地踏查、听取进度情况汇报和查阅相关财务、内业等方式进行绩效运行监控。

二、监控范围

2024年度衔接资金项目，选取其中的2024年长青乡四合村现代农业产业园项目作为年度重点项目开展绩效运行监控。

三、绩效目标完成情况

项目预算金额为700万元，实际执行数488万元，项目资金执行率69.7%。完成建设内容，完成建设大棚11栋。

项目(工程)验收合格率100%




项目(工程)完成及时率100%

四、监控结论和有关建议

郊区乡村振兴局能够按计划组织实施2024年长青乡四合村现代农业产业园项目，能够按照绩效管理要求对项目绩效目标进行全程绩效管理，项目整体实施较好。

郊区乡村振兴局要做好项目实施收尾工作，及时申请拨付剩余项目资金，持续做好年度实施全部项目的绩效监控，定期对项目资金绩效目标执行情况跟踪分析，强化项目绩效管理，发挥资金最大效益。

附件：

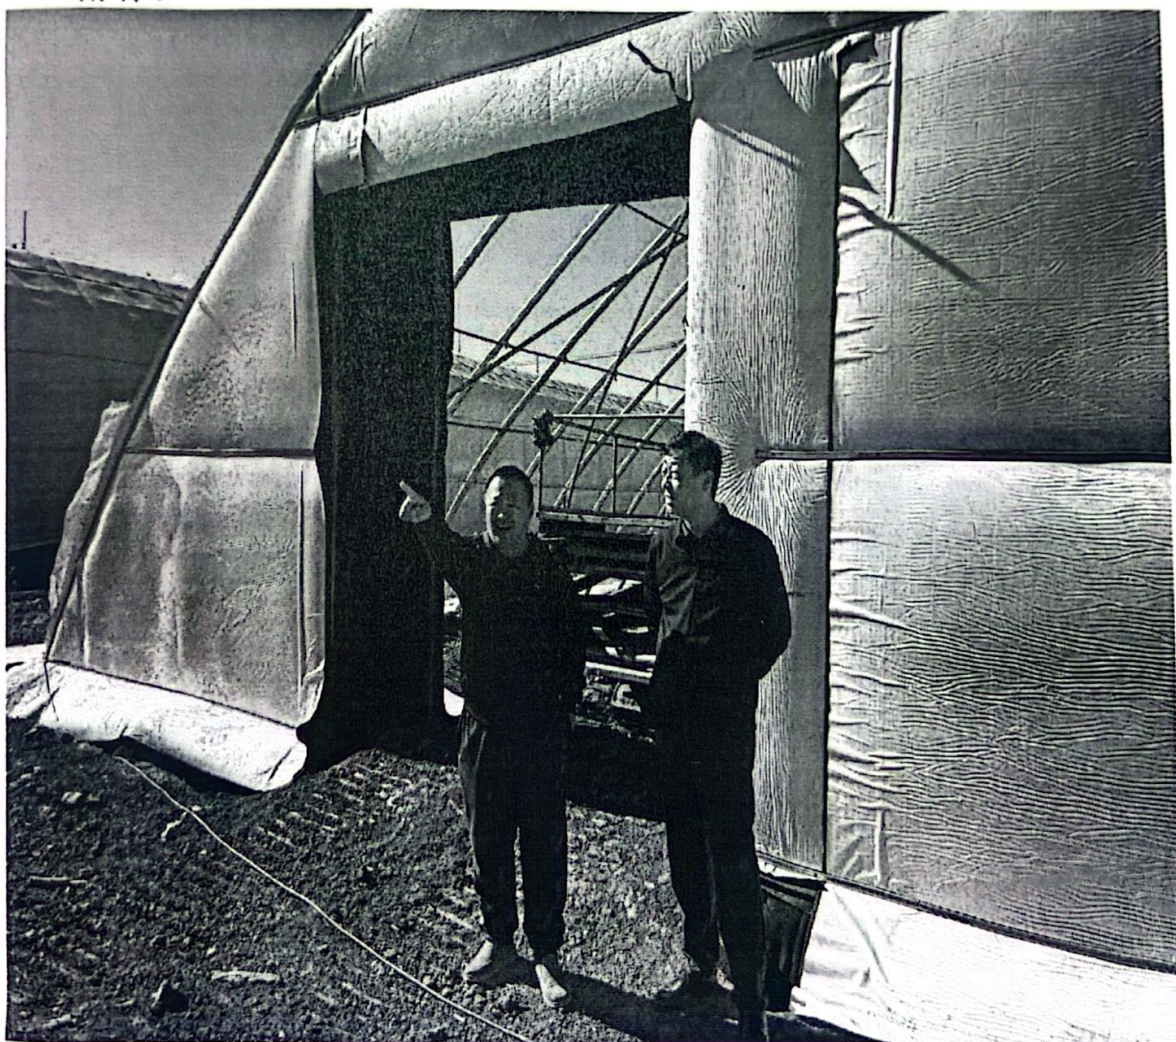



佳木斯市郊区乡村振兴局



佳木斯市郊区财政局



2024年11月25日

